

Aan : Stuurgroep Programma Medicatieoverdracht

Van : Projectteam Kickstart Medicatieoverdracht

Datum : 10 december 2024

Versie : 1.1

Onderwerp : Addendum plan van aanpak Kickstart v3.1 - aanpassing Kickstartplanning en aanpak n.a.v. besluitvorming stuurgroep MO dd. 16 oktober en 5 december 2024

Inleiding


Op 16 oktober jl. is de stuurgroep Medicatieoverdracht akkoord gegaan met aanpassingen op de aanpak en planning van de Kickstart. In dit addendum worden deze aanpassingen beschreven en als wijziging toegevoegd aan het plan van aanpak Kickstart v3.1.

Gewijzigde aanpak Kickstart

De Kickstart gaat in 2025 live met een kleinere functionaliteit. De overige onderdelen volgen later in één of meerdere livegangen waardoor de volledige scope van MP9 behouden blijft. Deze aanpak wordt een getrapte livegang genoemd. De stuurgroep heeft op 5 december jl. de set voor de eerste livegang vastgesteld, zie bijlage 1.

Wijziging Kickstart planning

De gewijzigde aanpak leidt tot een nieuwe planning. Figuur 4 in paragraaf 4.2 van het plan van aanpak en de eerder geaccordeerde addenda wijzigt. De nieuwe figuur 4 is hieronder opgenomen. De planning van de volgende livegang wordt in de loop van 2025 bepaald. Een grove inschatting voor een tweede livegang is medio 2026.

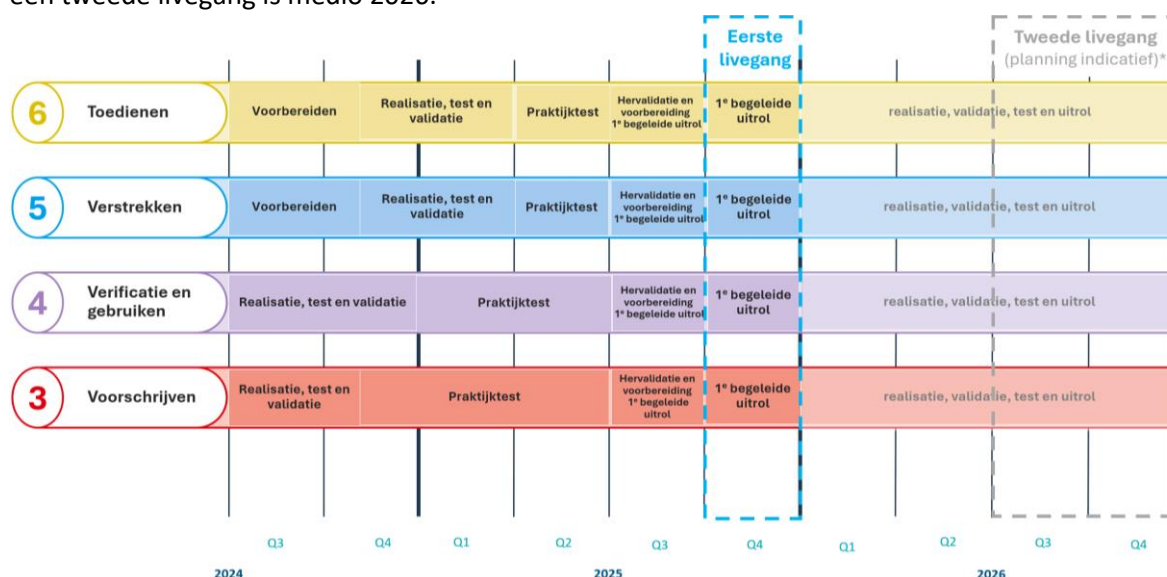

* De planning van de tweede livegang wordt in overleg met de Kickstart deelnemers definitief bepaald in 2025.

Aanpassingen onderdelen plan van aanpak Kickstart 3.1

Bovenstaande aanpassingen leiden tot wijzigingen in de volgende paragrafen of hoofdstukken:

4.2 Gefaseerde implementatie medicatiestappen

- De Kickstart planning in figuur 4 is aanpast met bovenstaande planning.
- Toegevoegd wordt dat de Kickstart werkt met een getrapte livegang:
 - de eerste begeleide uitrol vindt plaats in Q4 2025 met de set in bijlage 1;
 - de planning van de volgende tweede livegang (eerste begeleide uitrol met de tweede set) volgt naar verwachting in de eerste helft van 2025;
 - in voorbereiding van de volgende livegang worden de fasen, zoals uitgewerkt in paragraaf 4.2.3 ontwikkelfase tot en met 4.2.6 eerste begeleide uitrol, opnieuw doorlopen voor de volgende set.
- Onderdeel 4.2.5 Hervalidatie en voorbereiding eerste begeleide uitrol wordt ingevoegd.
- Onderdeel 4.2.5 Eerste begeleide uitrol wijzigt naar 4.2.6 Eerste begeleide uitrol.

4.2.5 Hervalidatie en voorbereiding eerste begeleide uitrol

Dit betreft een nieuw onderdeel.

Na de afronding van de praktijktestfase van alle stappen volgt een extra kwartaal ten behoeve van hervalidatie op de definitieve release en voorbereiding richting de eerste begeleide uitrol. Dit laatste bestaat uit het terugpoorten HiX versie 6.4 naar versie 6.3 door Chipsoft, het uitvoeren van regressietesten en de implementatievoorbereiding, zoals het opleiden van medewerkers van de zorgaanbieders.

4.2.6 Eerste begeleide uitrol

De geschetste doorlooptijd van de eerste begeleide uitrol van de eerste set wordt aangepast van 6 maanden naar 3 maanden in verband met de opstart van de vervolgfase met dezelfde leveranciers. De doorlooptijd van de eerste begeleide uitrol van de tweede set wordt vastgesteld op basis van de ervaring van de eerste livegang en wordt dus later bepaald.

Bijlage 1 – Set eerste livegang

	Functie	Voorschrijvend	Verstrekend	Toedienend	PGO
Stap 3	MA+-VV +kenmerken	versturen	ontvangen		
	MA	beschikbaar stellen		raadplegen	raadplegen
		raadplegen	raadplegen	raadplegen	raadplegen
		versturen ontvangen	ontvangen		
VV	beschikbaar stellen			raadplegen	
WDS	beschikbaar stellen				
	raadplegen	raadplegen	raadplegen	raadplegen	
	versturen ontvangen		ontvangen		
Stap 4	MGB	beschikbaar stellen	beschikbaar stellen	beschikbaar stellen	
		raadplegen	raadplegen	raadplegen	raadplegen
		versturen	versturen		
		ontvangen	ontvangen		
Stap 5	TA+-MVE	ontvangen	versturen		
	TA	raadplegen	beschikbaar stellen	raadplegen	raadplegen
			raadplegen	raadplegen	raadplegen
		ontvangen	versturen ontvangen		
	MVE	raadplegen	beschikbaar stellen	raadplegen	raadplegen
		ontvangen	versturen ontvangen		
	VVV	ontvangen	versturen		
	AVVV	versturen	ontvangen		
	VMA	ontvangen	versturen		
	AVMA	versturen	ontvangen		
Stap 6	Toedienlijst			raadplegen	
	MTD	beschikbaar stellen raadplegen	raadplegen	beschikbaar stellen raadplegen	raadplegen
Alg	Consolideren	X	X	X	X
	Migratie	X	X	X	X
	Hybride	X	X	X	X

Legenda

Set livegang 2025
